

Sprint 合并任务看板规范

项目：校园互助服务平台（CampusHub）

阶段：P4 — 编码与开发

一、概述

任务概览

优先级	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准
P0	用户管理	注册、登录、个人资料管理	5h	刘映池	用户登录、注册、个人资料编辑功能以及用户信息前端持久化能在开发环境的前端页面下使用，实现个人界面、注册登录页面，能够通过单元测试及与后续模块结合的集成测试
P0	需求发布	发布需求、需求列表、需求详情	5h	刘映池	需求发布、查看需求列表、搜索需求、查看需求详情功能能在开发环境的前端页面下使用，实现需求编辑页面、需求列表页面、需求详情页面，能够通过单元测试及与后续模块结合的集成测试
P0	订单管理	接单、状态流转、订单历史	5h	刘渝川	接单、状态流转、订单历史功能能在开发环境、测试环境、生产环境下使用，实现用户管理自己订单的前端界面和根据身份对订单进行操作，能够通过单元测试及与后续模块结合的集成测试
P1	评价与信用体系	双向评分、信用分计算	5h	孙博一	双向评分、信用分计算功能能在开发环境、测试环境、生产环境下使用，实现用户评价、信用分计算功能，实现评分与评价页面和其他页面（主页等）对信用分的展示与计算，能够通过单元测试及与后续模块结合的集成测试
P1	消息通知	通知触发、消息模板、通知记录、用户交互	5h	陆俊达	实现消息更新时的通知和用户间进行对话的会话页面实现与实时更新（类似微信聊天界面）
P2	扩展功能	管理后台等	10h	暂定	确保实现合理的管理和用户实用功能的扩展
P3	数据与操作安全	通过后端对权限和数据 进行控制，对数据进行 加密存储，对用户操作 进行审计，对异常行为 进行拦截	10h	暂定	确保系统在开发环境、测试环境、生产环境下能够安全运行，满足权限控制与数据保护需求
测试	测试保障	单元测试、集成测试、 联调验证	20h	全体	确保业务逻辑能够通过常见用例模拟的测试和保证极端情况下响应的正确性

优先级	模块	任务	估计工时	负责人	完成标准
				成员	

先确保P0任务、P1任务开发结束，如果有空闲时间再对P2任务，P3任务进行开发。

二、任务拆分

用户管理

任务	估计工时	依赖
后端：用户注册接口（手机号/邮箱、密码加密）	1h	无
后端：用户登录接口（JWT生成与验证）	1h	注册接口
后端：个人资料CRUD接口（获取/更新/修改密码）	1h	登录认证
后端：用户信息前端持久化（LocalStorage/Token管理）	0.5h	登录接口
前端：注册页面设计与表单验证	0.5h	无
前端：登录页面设计与Token存储	0.5h	注册页面
前端：个人中心页面（资料展示/编辑/头像上传）	0.5h	资料接口
单元测试：用户Service层测试	1h	接口完成

需求发布

任务	估计工时	依赖
后端：发布需求接口（标题、描述、分类、报酬、截止时间）	1h	用户认证
后端：需求列表接口（分页、排序、筛选）	1h	发布接口
后端：需求详情接口	0.5h	列表接口
后端：搜索需求接口（关键词匹配）	0.5h	列表接口
后端：删除/修改需求接口（仅发布者可操作）	0.5h	发布接口
前端：需求编辑/发布页面（表单+富文本）	1h	发布接口
前端：需求列表页面（卡片式展示、分页、筛选栏）	0.5h	列表接口
前端：需求详情页面（信息展示+接单按钮）	0.5h	详情接口
单元测试：需求Service层测试	0.5h	接口完成

订单管理

任务	估计工时	依赖
后端：接单接口（创建订单、需求状态变更）	1h	需求发布模块
后端：订单状态流转接口（待接单→进行中→待验收→已完成/取消）	1.5h	接单接口
后端：订单历史列表接口（按用户身份筛选：我发布的/我接的）	1h	状态流转
后端：订单详情接口	0.5h	接单接口
后端：订单取消/完成确认接口（权限校验）	0.5h	状态流转
前端：我的订单页面（Tab切换：我发布的/我接的）	1h	历史列表接口
前端：订单详情页面（状态展示、操作按钮动态显示）	0.5h	订单详情接口
前端：接单确认弹窗/页面	0.5h	接单接口
单元测试：订单Service层测试	0.5h	接口完成
集成测试：订单-需求联动测试	0.5h	所有接口完成

评价与信用体系


任务	估计工时	依赖
后端：评价接口（订单完成后双向评分1-5星、文字评价）	1h	订单完成状态
后端：信用分计算算法（基础分+评价均分-违约扣分）	1.5h	评价接口
后端：用户信用分查询接口	0.5h	信用分计算
后端：用户评价历史接口	0.5h	评价接口
前端：评分与评价弹窗组件（订单完成后触发）	1h	评价接口
前端：评价与信用分展示组件（主页/个人中心/需求详情）	0.5h	信用分查询接口
前端：用户评价历史页面	0.5h	评价历史接口
单元测试：信用分计算逻辑测试	0.5h	信用分计算完成

消息通知

任务	估计工时	依赖
后端：WebSocket配置与连接管理	1h	无
后端：消息实体与数据库设计（会话/消息记录）	0.5h	无
后端：发送消息接口（一对一/需求群聊）	1h	WebSocket配置
后端：消息历史记录接口	0.5h	消息实体
后端：通知触发器（接单/状态变更/评价时触发）	1h	订单模块/评价模块
前端：即时消息页面（会话列表+聊天界面，实时刷新）	1h	WebSocket连接

任务	估计工时	依赖
前端：消息通知组件（全局通知/红点提示）	0.5h	通知触发器
单元测试：消息发送与接收测试	0.5h	接口完成

三、任务依赖关系图

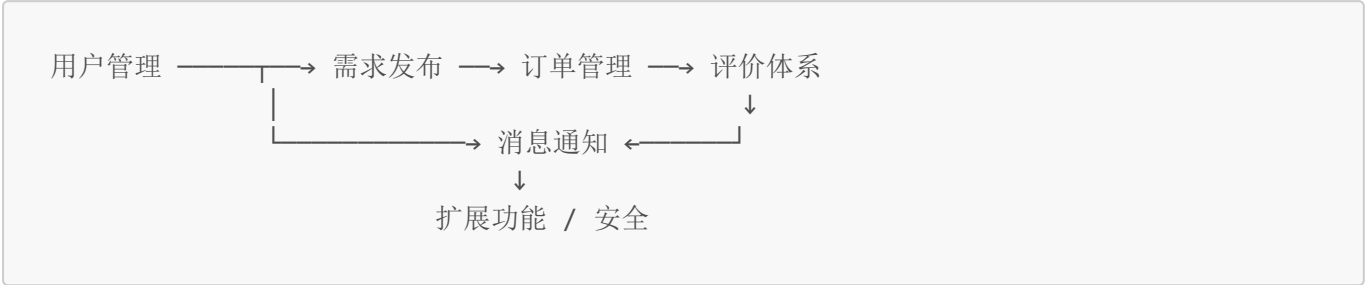

四、Sprint 执行规划

阶段	时间	重点任务
第1-2天	10h	用户管理 + 需求发布（并行开发）
第3-4天	10h	订单管理（核心流程打通）
第5天	5h	评价体系 + 消息通知（并行）
第6天	5h	集成测试 + Bug修复
第7天	5h	联调验证 + 交付准备
